



Gemeinde Sagogn
Erneuerung Via Sorts und Via Patialas, Terminprogramm

Stand 26.04.2018


E.7152.1091.0001.*50001853*15.03.2018

Bauprogramm 2018 (siehe auch Planbeilage auf Seite 2)	W 13	W 14	W 15	W 16	W 17	W 18	W 19	W 20	W 21	W 22	W 23	W 24	W 25	W 26	W 27	W 28
	26.03. - 01.04.18	02.04. - 08.04.18	09.04. - 15.04.18	16.04. - 22.04.18	23.04. - 29.04.18	30.04. - 06.05.18	07.05. - 13.05.18	14.05. - 20.05.18	21.05. - 27.05.18	28.05. - 03.06.18	04.06. - 10.06.18	11.06. - 17.06.18	18.06. - 24.06.18	25.06. - 01.07.18	02.07. - 08.07.18	09.07. - 15.07.18
Installationsarbeiten																
Etappe 1, talseitig																
Zufahrt StWEG Patialas																
Etappe 2, talseitig inkl. Betonmauer																
Etappe 3, talseitig																
Etappe 4, bergseitig																
Etappe 5, bergseitig																
Etappe 6, bergseitig																
Etappe 7, ganze Strassenbreite																
Regenwasserableitung																
Belagsarbeiten																
Fertigstellungsarbeiten																

- während Bauetappen 1 bis 3 (02.04. bis 13.05.2018) ist die Zufahrt zu den einzelnen Liegenschaften ab Parz. Nr. 44/23 nicht gewährleistet
- während Bauetappen 4 bis 6 (14.05. bis 01.06.2018) ist die Zufahrt zu den einzelnen Liegenschaften eingeschränkt gewährleistet
- während Bauetappe 7 (04.06. bis 15.06.2018) ist die Zufahrt zur Via Sorts und Via Patialas nicht gewährleistet
- Im Bauprogramm wurden Verzögerungen wegen ausserordentlichen Wetterverhältnissen nicht berücksichtigt.



Gemeinde Sagogn Erneuerung Via Sorts und Via Patialas, Bautappen, Situation

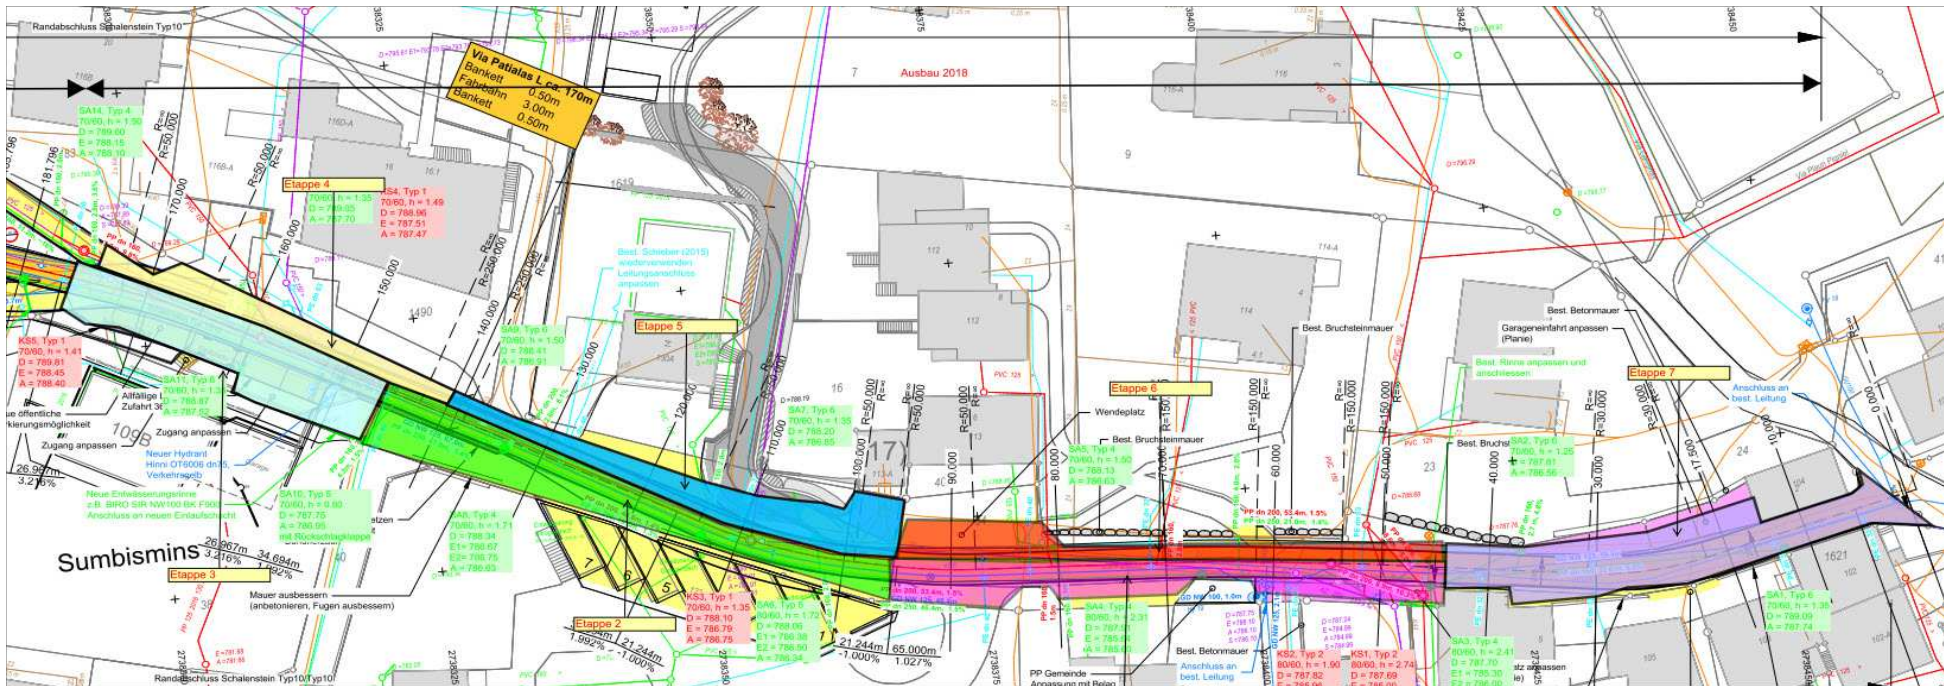


Etappe 1, talseitig



Etappe 2, talseitig inkl. Betonmauer



Etappe 3, talseitig



Etappe 4, bergseitig



Etappe 5, bergseitig



Etappe 6, bergseitig



Etappe 7, ganze Strassenbreite
